



△□○◇細谷オーバーレイ濃縮機加熱パネル マグネタイサー取付、開放点検報告 1/2  
 開放点検 98.10.8 立会者 工務部保全技術課 水野課長様 高橋課長様 KK■◇★ 中村  
 マグネタイサー-M6\*3set 内 98.7.17 2set 取付 (83 日経過) 98.10.12 1set 追加

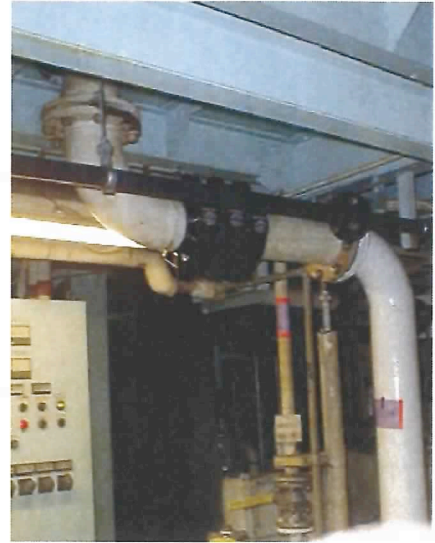

プレート型熱交換装置

マグネタイサー-M6\*3set 98.10.12 時

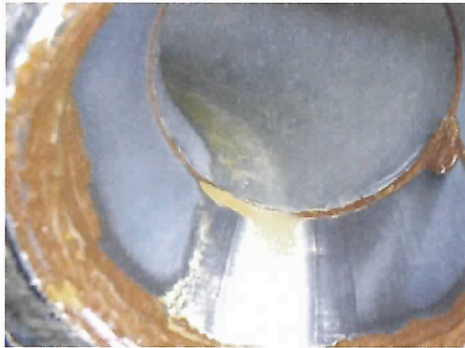


IN 側管内部

OUT 側管内部

熱交プレート内 堆積スラッジ量が  
以前の 1/10~1/15 に減ったと云う

従来より付着物が激減した

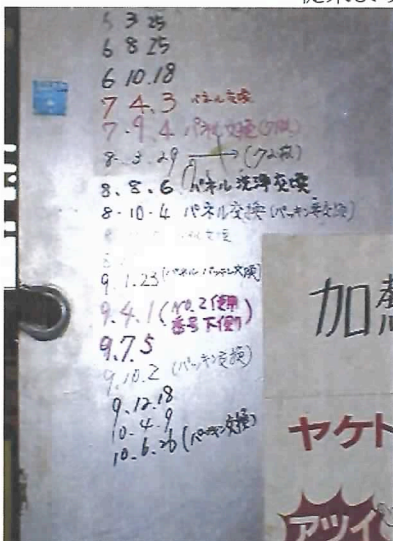

メンテ記録

こびり付きが減りブラシで楽に取れる様になった

洗浄後のプレート

年間 3~4 回メンテしていたものを 年間 1~2 回に又パッキン交換も減らせられるのではないかと期待される。  
 今後はメンテ回数減少の為、どの位の期間を維持継続可能か耐久期間を調査検討する。
